

Réunion d'information Travaux - Mobilité

Hanzinelle - 18 septembre 2024


Un chantier coordonné en synergie (rappel)

- Elia - Gestionnaire du Réseau de Transport d'électricité ;
- ORES - Gestionnaire du Réseau de Distribution d'électricité ;
- *Luminus - Fournisseur de gaz et électricité ;*
- Proximus - Entreprise de telecommunication
- SPW (voiries régionales)
- Inasep: Intercommunale namuroise de services publics (production et distribution d'eau)

- Une entreprise commune: A.M. BESIX/Bonfond

Objectif : coordonner les différents chantiers pour réduire l'impact de ceux-ci sur votre environnement et votre mobilité.


Planning du chantier

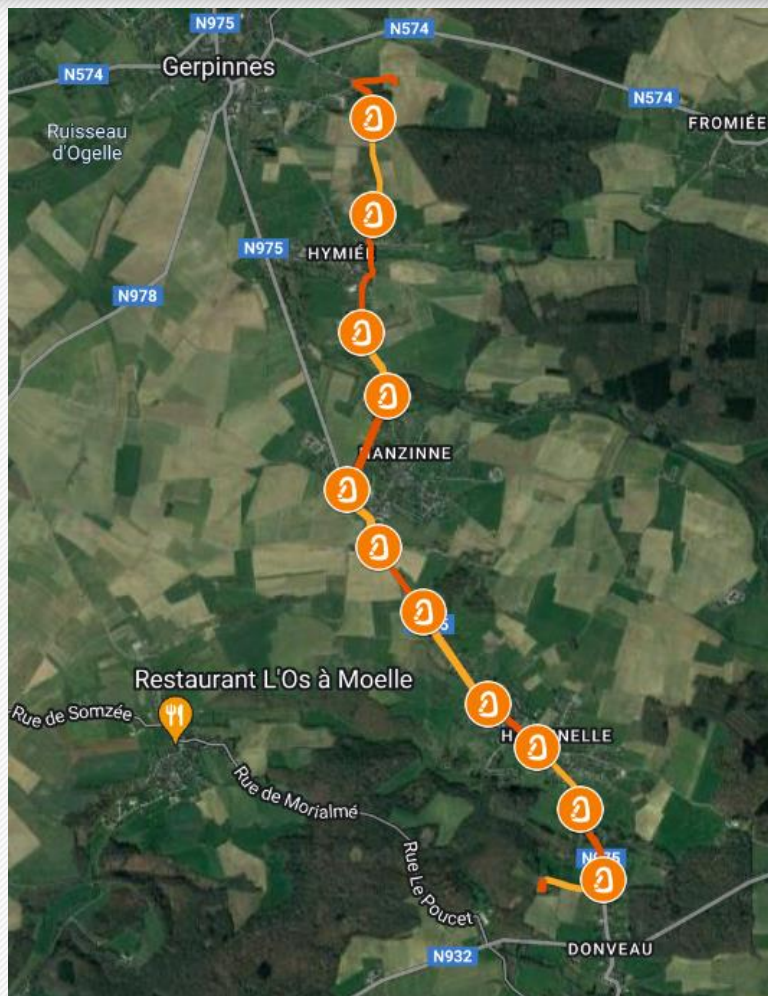

Une carte interactive mise à jour le plus régulièrement possible




Dernière partie presque finalisée

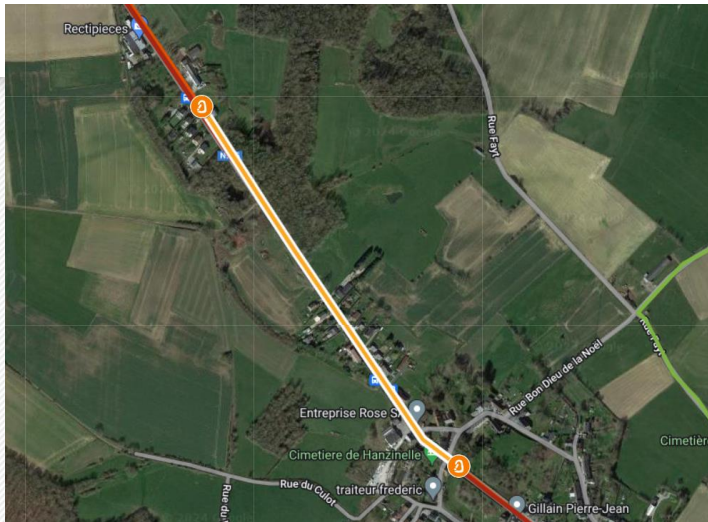

→ Les travaux entre J9 et J8 sont terminés (*hormis 200m d'asphaltage*)

Planning de chantier - actuellement

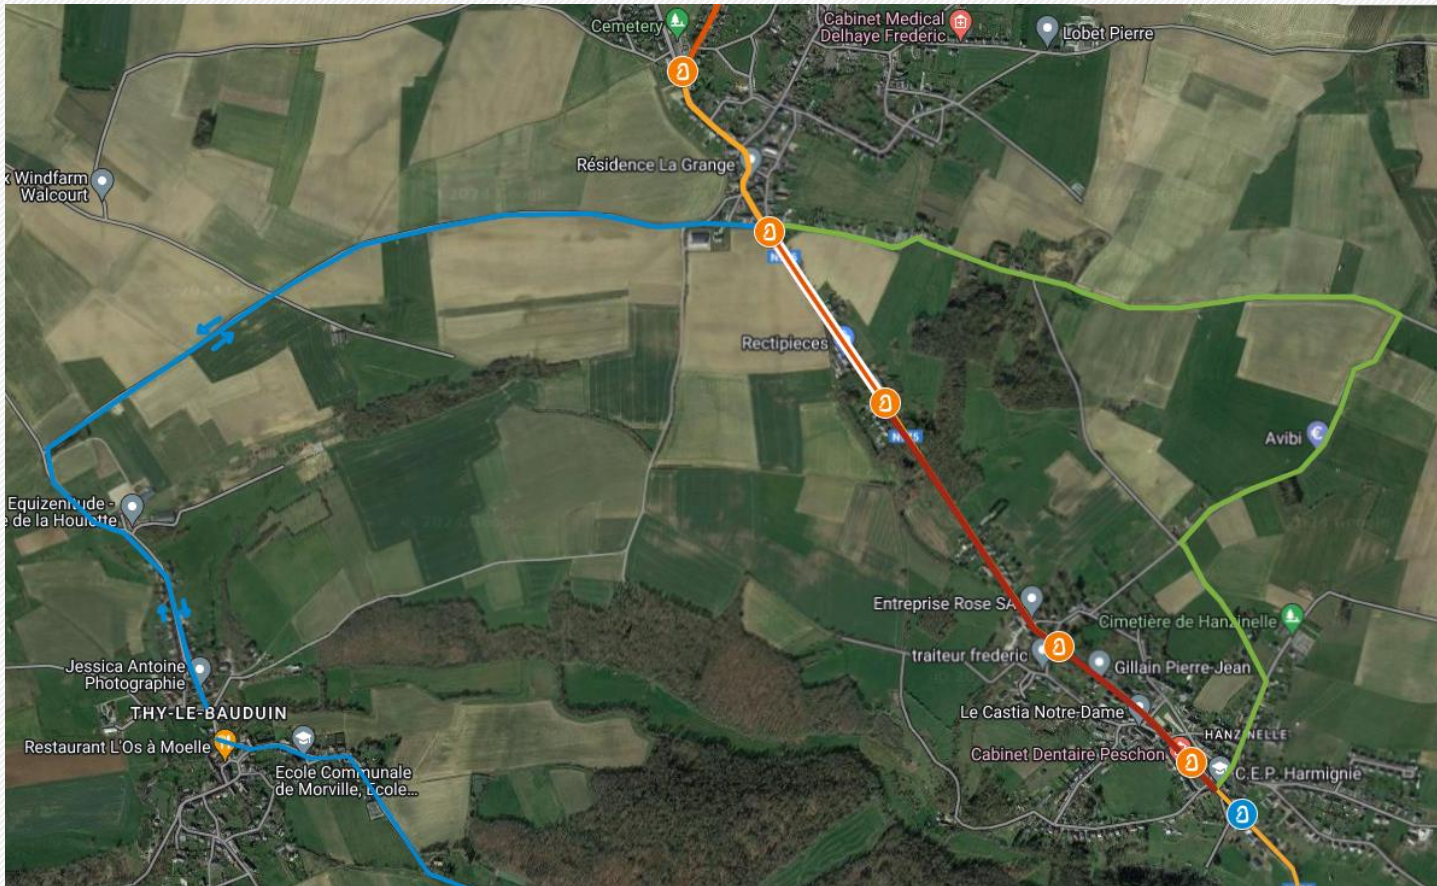

- Finalisation des travaux entre les jonctions 6 et 8
- Report au **4 octobre 2024** (au lieu du 23/08/2024)
- Prolongation du service de navette pour les écoliers

Pourquoi ces ajustements de planning?


Le chantier a actuellement 6 semaines de retard par rapport au planning annoncé en mai dernier.

Quelles sont les raisons de ces ajustements de planning?

- **Demandes imprévues** émanant d'autres partenaires (SPW, Inasep)
 - Notamment des traversées Inasep rendant toute circulation sur le chantier impossible (y compris pour nos engins)
- Installation de **filets d'eau** à la demande du SPW
- Horaires contraignants demandés par les riverains et la commune (**à juste titre**)
 - Conséquences : **nombreux refus de livraison** après 5h du matin et donc pénurie de matériaux (chantier arrêté faute de matériaux)




Planning de chantier

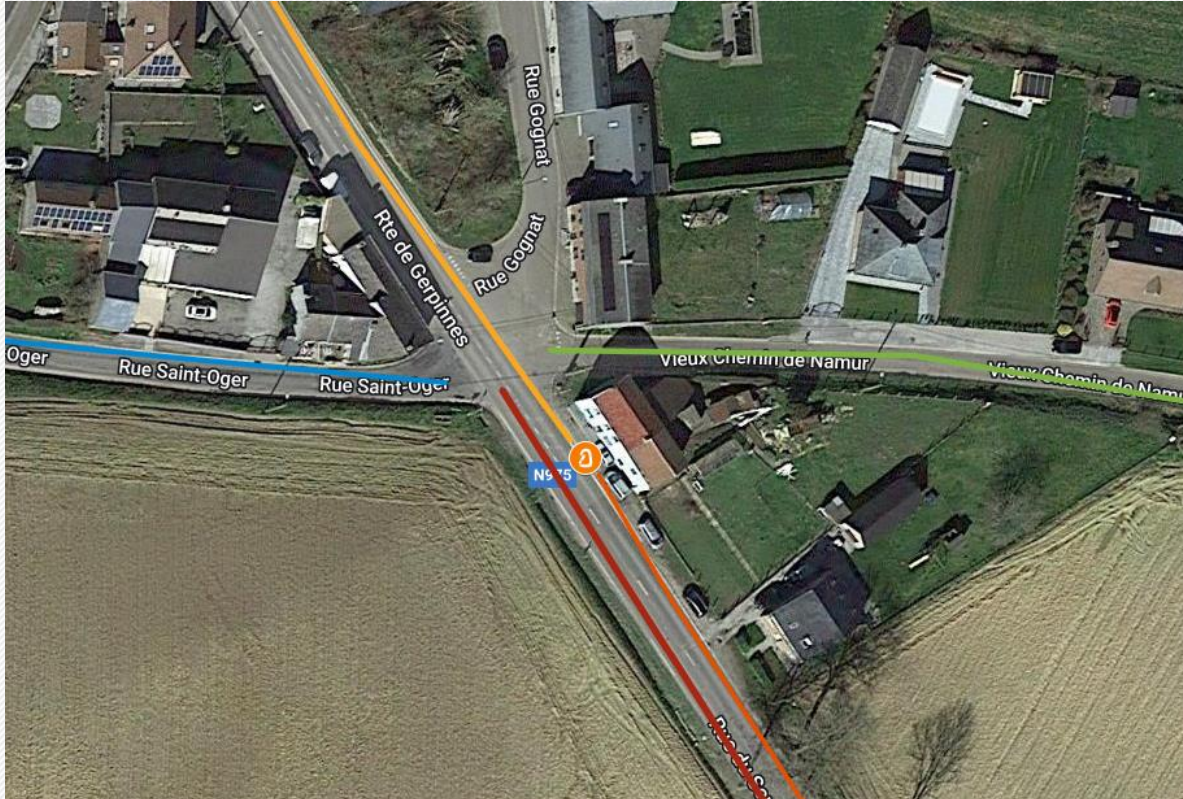

Après réouverture, des travaux sont à prévoir entre J6 et J7, au niveau du puits de jonction

- Durée d'une semaine
- Circulation possible au moyen de feux tricolores



Planning de chantier




Du 7 octobre 2024 au 6 décembre 2024 :

→ Travaux entre les jonctions 5 et 6

→ Fin des travaux sur la N975


Planning de chantier

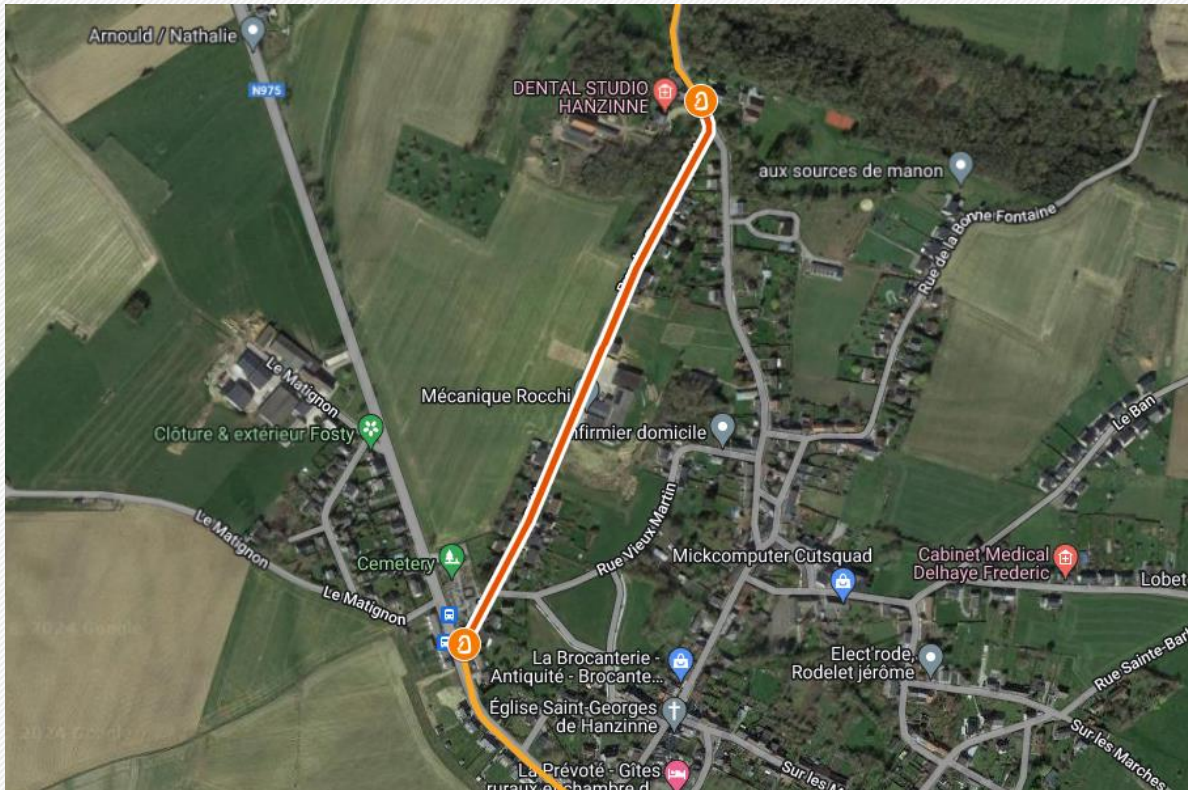

Du 9 décembre 2024 au 7 février 2025 :

→ Travaux entre les jonctions 4 et 5

Déviations et mobilité

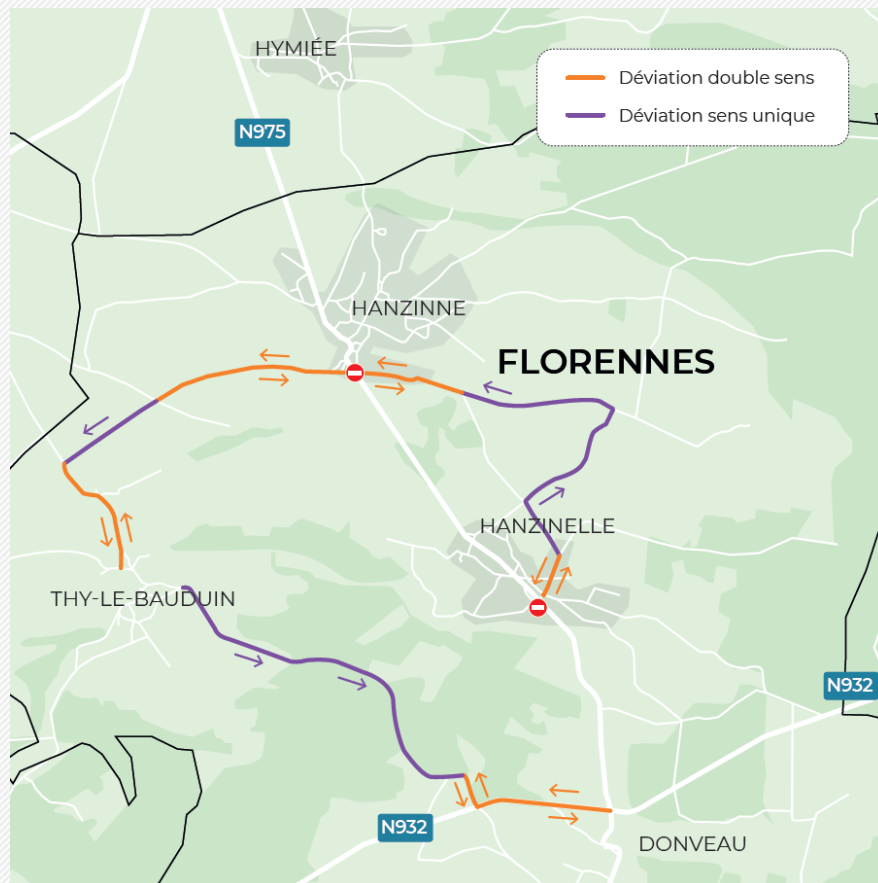

À partir du vendredi 5 octobre

→ Fin de la grande déviation

→ Des travaux de réfection seront prévus dans la Rue des Marches

Déviations et mobilité



- Du 7 octobre au 6 décembre 2024
- Nouvelle déviation rendant possibles les travaux entre J5 et J6 (à encore valider)
- Via **Rue des Fosses au sable, Rue des combattants et Rue Gognat**
- Double sens de circulation

Rappels de sécurité




- La vitesse de tout véhicule est limitée à 50 Km/h sur les différents tronçons de voirie repris dans la déviation et situés hors agglomération



- La circulation de tout véhicule est interdite aux véhicules dont la masse en charge excède 7.5 T sur les différents tronçons de voirie repris dans la déviation et situés hors agglomération

Comment vous informer ?

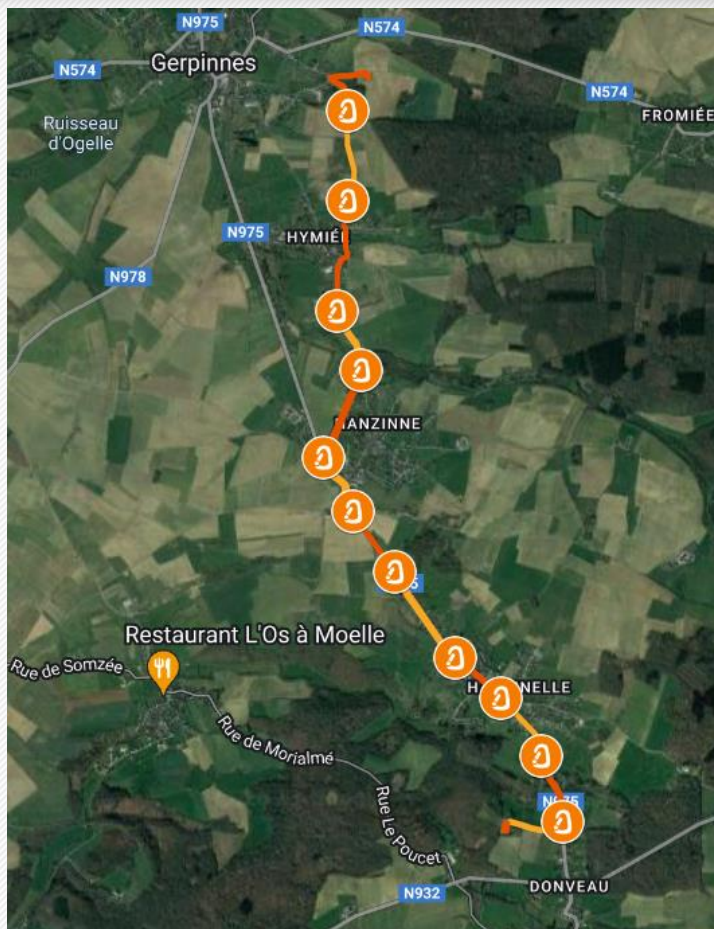

- Une page projet sur le site d'Elia ;
- Une carte interactive pour le suivi du chantier ;
- Mail box et numéro vert



Questions-Réponses

Merci !
